

RELATÓRIO DE GERAÇÃO · FECHAMENTO MENSAL

Agosto / 2026

CLIENTE

Eninsa

USINA

Porto Ferreira · 7,40 MWp



§1 Resumo e Considerações Gerais

Indicadores-chave e síntese do mês de Agosto / 2026

ENERGIA MEDIDA NA FRONTEIRA · CONCESSIONÁRIA

MEDIDO NA FRONTEIRA

1.034,4 MWh

vs PVsyst +0,1% · perda
inv→fronteira 2,86%

CONTA DE ENERGIA

—

Aguardando fatura

Δ FRONTEIRA × CONTA

—

Aguardando fatura

PERDAS POR PARADAS

0,0 MWh

0,00% da geração perdida no
mês · base fronteira

ENERGIA MEDIDA NO INVERSOR

ENERGIA · INVERSOR

1.064,9

MWh

Yield 144 kWh/kWp · PR
81,56%

VS PROJETO PVSYST

3,1 %

Projeto: 1.033,0 MWh

VS PREVISTO
(METEO)

—

Preencha POA (ou GHI)
na página Projeto

ENERGIA POTENCIAL

1.064,9

MWh

Medido + perdas em
paradas

POTENCIAL VS
PVSYST

+3,1 %

Projeto: 1.033,0 MWh

DISPONIBILIDADE ENERGÉTICA E IRRADIAÇÃO

DISPONIB. REAL

100,00%

Considera todas as paradas

DISPONIB. CONTRATUAL

100,00%

Exclui causas externas

MEDIDA × PROJETO

—

Sem POA/GHI do Projeto
cadastrado

CLIMA (PROJ × PREV)

—

Desvio do PVsyst pela meteo
real

CONSIDERAÇÕES GERAIS DO MÊS DE AGOSTO Síntese do mês, ações tomadas e recomendações para o próximo período.

No mês de agosto de 2026, a UFV Porto Ferreira apresentou um desempenho operacional e energético excepcional, caracterizado por alta estabilidade e rendimento superior às metas de projeto, com uma geração real nos inversores de 1.064,9 MWh (3,1% acima do projetado no PVsyst), produtividade de 143,85 kWh/kWp e um Performance Ratio real de 82,21%, que superou significativamente os 72,5% estimados; paralelamente, as rotinas de O&M foram concluídas no dia 31/08 com manutenções preventivas, termografia e reparos em cabos de fibra óptica, consolidando um cenário altamente positivo que valida a eficiência e a confiabilidade dos ativos da usina.


§2 Detalhamento mensal

Medido vs Projeto no ano de 2026. Mês de referência destacado.

GERAÇÃO DIÁRIA · AGOSTO/2026

----- Projeto · 1.033,0 MWh no mês · ~33,32 MWh/dia


Energia por dia · valor em MWh sobre cada barra · linha colorida = irradiação POA (kWh/m², eixo à direita).

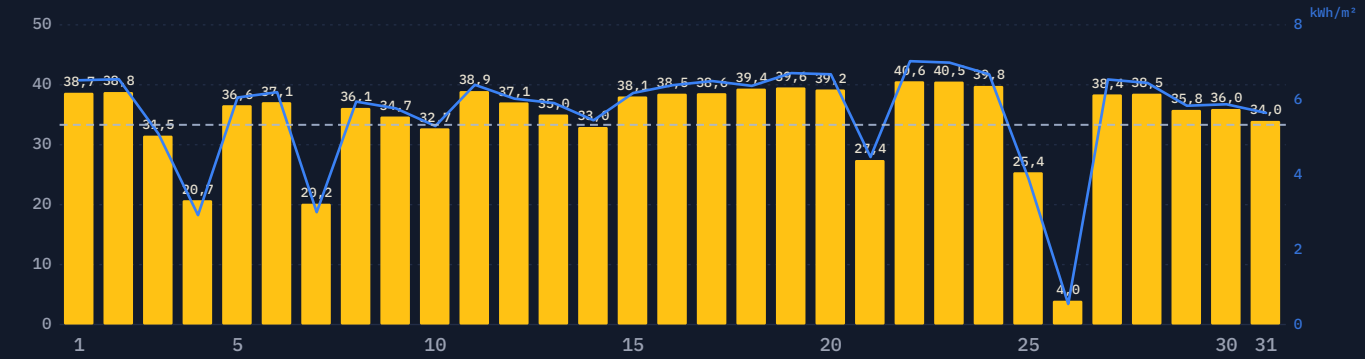

PERFORMANCE RATIO DIÁRIO · AGOSTO/2026

----- PR projeto · 72,5%

PR por dia · geração ÷ (irradiância × capacidade) · dia sem dado fica sem barra.

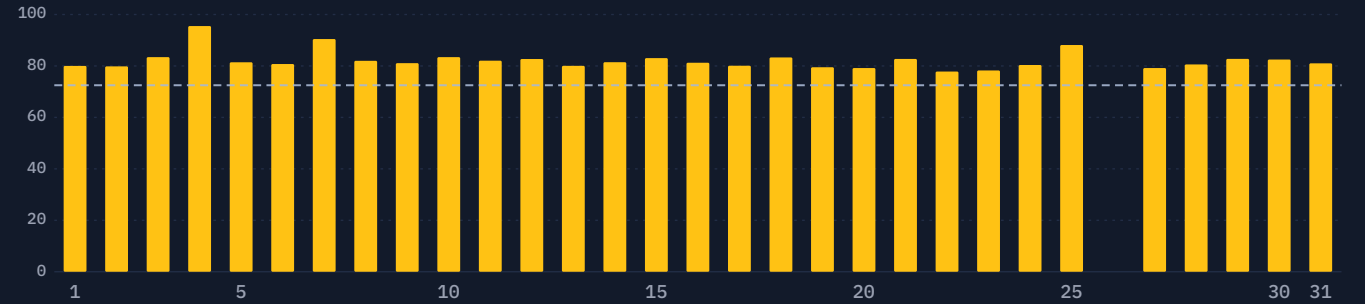

HISTÓRICO MENSAL · MEDIÇÃO NO INVERSOR

Energia medida e projetada por mês, com desvio e disponibilidade energética.


MÊS	MEDIDO (MWH)	PROJETO (MWH)	VS PROJETO	DISPONIB. REAL	DISPONIB. CONTRATUAL
Jun	728,2	852,0	-14,5%	96,91%	96,91%
Jul	963,3	950,0	+1,4%	97,20%	99,74%
Ago	1.064,9	1.033,0	+3,1%	100,00%	100,00%
Total 2026	2.756,4	2.835,0	-2,8%	—	—

§3 Performance por UC

5 unidades · PR, Produtividade e Disponibilidade no mês


PERFORMANCE RATIO POR UC

Zonas 75% / 80%



PRODUTIVIDADE POR UC

kWh por kWp instalado



DISPONIBILIDADE ENERGÉTICA POR UC

Horas paradas (diurnas) recortadas ao mês e disponibilidade — mesma fonte da seção Paradas



§4 Paradas e indisponibilidades

0 eventos · 0min paradas somadas por inversor · 0,00 MWh perdidos

Sem paradas registradas no período.

§5 Condições meteorológicas

Irradiação e temperatura medidas em Agosto / 2026

HPOA ACUMULADO

176 kWh/m²

Plano dos módulos

GHI ACUMULADO

150 kWh/m²

HPOA/GHI = 1,172

TEMP. AMBIENTE

-14,3 °C

Máx 0,0°C


TEMP. MÓDULO

37,7 °C

Máx 55,2°C

IRRADIAÇÃO E TEMPERATURA · DETALHE DIÁRIO

Barras: HPOA real vs projeto (tracejado) + GHI · Linhas: temperatura (°C)

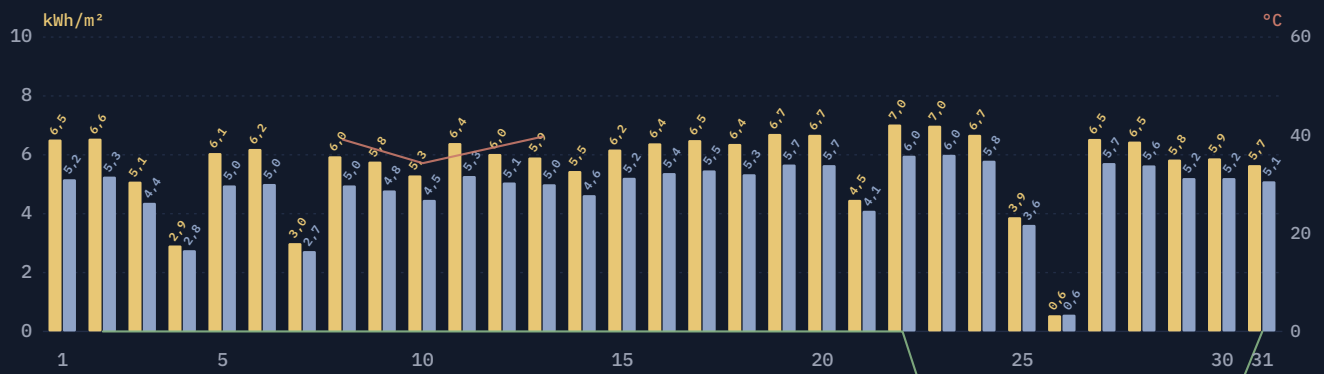


§6 Produtividade e performance · mês a mês

Comparação ao longo de 2026 — medido vs projeto, mês a mês.


PRODUTIVIDADE DA USINA

kWh/kWp · medido vs projeto

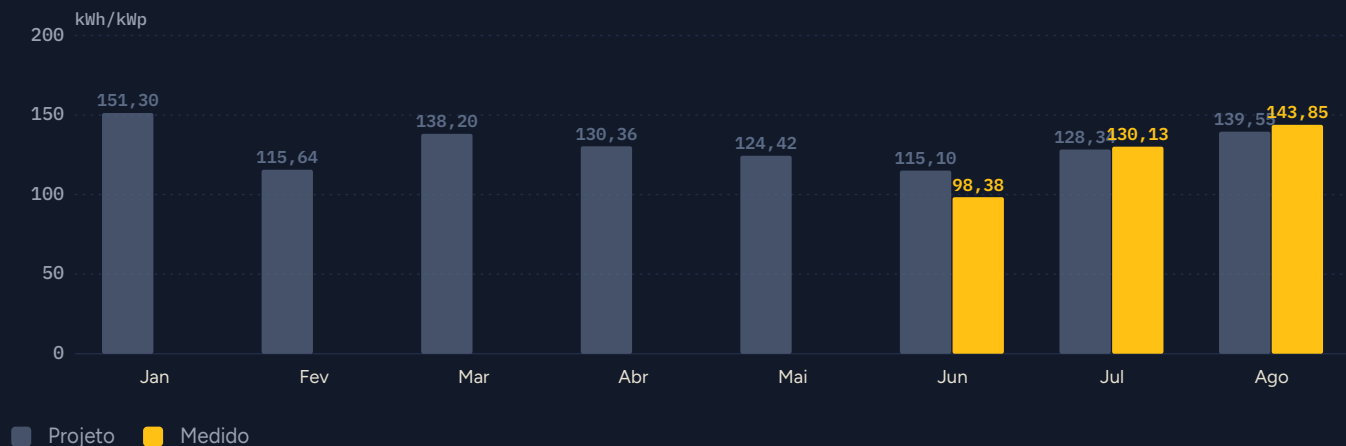

PERFORMANCE RATIO DA USINA

% · medido vs projeto

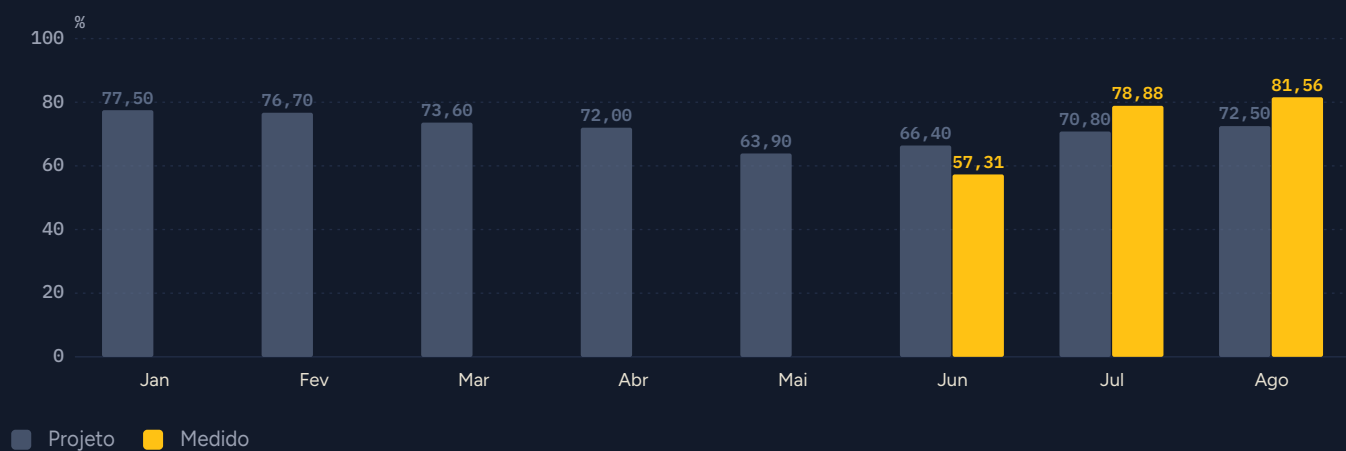

§7 Geração por skid

5 skids · energia medida no mês

GERAÇÃO POR SKID

MWh medidos por skid · Agosto / 2026



SKID	CAPACIDADE (KWP)	GERAÇÃO (MWH)	SHARE	KWH/KWP
SKID-04	1.481	214,75	20,2%	145,05
SKID-02	1.481	214,63	20,2%	144,97
SKID-03	1.481	213,49	20,0%	144,20
SKID-05	1.481	211,73	19,9%	143,01
SKID-01	1.481	210,27	19,7%	142,03
Total	7.403	1.064,87	100%	143,85

§8 Geração por inversor

Geração, rendimento (kWh/kWp) e desvio da média da usina no mês — por inversor.

INVERSORES			
INVERSOR	GERAÇÃO (KWH)	KWH/KWP	DESV. MÉDIA
Inv 11	52.872	148,80	-0,6%
Inv 12	53.466	142,55	+0,4%
Inv 13	54.121	144,30	+1,7%
Inv 14	49.810	132,81	-6,6%
Inv 21	52.764	140,68	-1,0%
Inv 22	53.961	151,87	+1,4%
Inv 23	53.763	143,35	+1,0%
Inv 24	54.137	144,34	+1,7%
Inv 31	54.071	144,17	+1,7%
Inv 32	53.263	149,90	+0,1%
Inv 33	53.850	143,58	+1,2%
Inv 34	52.304	139,45	-1,9%
Inv 41	54.182	152,49	+1,8%
Inv 42	54.114	144,28	+1,6%
Inv 43	54.102	144,25	+1,6%
Inv 44	52.352	139,58	-1,9%
Inv 51	54.030	144,06	+1,5%
Inv 52	52.926	141,11	-0,5%
Inv 53	52.018	146,40	-2,2%
Inv 54	52.760	140,67	-1,1%
Total	1.064.866	143,85	—



Dúvidas sobre este relatório ou sobre a operação da sua usina? Aponte a câmera para o QR code e fale diretamente com a nossa equipe.



CONTATO

contato@splendoroem.com.br

(17) 99737-7626

splendoroem.com.br

[@splendoroem](https://www.instagram.com/splendoroem)
